

Autorità Urbana di Padova

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)

approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria
della Regione del Veneto n° 187 del 04.12.2023

Azione 2.7.1 Infrastrutture verdi in Area Urbana

Progetto 2

Parco urbano nel quartiere di Lion, Via San Francesco, Comune di Albignasego

Sindaco: Filippo Giacinti

Resp. Terzo Settore Gestione del Territorio e Patrimonio: Marco Carella

Resp. unico del progetto: Caterina Friso

via Milano, 7
35020 Albignasego (Pd)
tel +39 049 8042211
fax +39 049 8625188
e-mail info@obizzi.it
CF 80008790281



TITOLO DELL'INTERVENTO

PROGETTO ESECUTIVO

<i>Progetto architettonico e del paesaggio</i>	Archipiùdue Paolo Miotto, Mauro Sarti Architetti Associati Consulente	via Settima Strada 7, int. 1 35129 Padova (Pd) tel +39 049 7380542 e-mail info@archipiudue.com
<i>Geologia</i>	Dott. Geol. Sergio Drago Consulente	Via Piovega 41b35010 Borgoricco (Pd) e-mail geologia.drago@gmail.com
<i>Progetto idraulico</i>	Ing. David Voltan Consulente	Via Einaudi 24 45100 Rovigo (Pd) e-mail studiiovoltan@libero.it
<i>Progetto del verde</i>	Dott. For. Pamela Nichele Consulente	Vicolo dei Fabbrì 7 35013 Cittadella (Pd) e-mail pamelanichele@email.it
<i>Progetto impianti elettrici</i>	Per. Ind. Martino Cecchinato	Viale del Lavoro 54 35020 Ponte San Nicolò (Pd) e-mail cecchinato@2c-studio.it

TITOLO ELABORATO

NUMERO

Cronoprogramma

H

scala

-

revisione

REV 00

data

Ottobre 2024


codice file

H_0824_E00_R

N.	Attività	Durata gg.
1	Allestimento area deposito materiali, uffici e servizi nell'ambito dell'area	2
2	Demolizioni e rimozioni di recinzioni, porte campo da calcio e panchine	6
3	Scotico dell'area e deposito della terra da riutilizzare	11
4	Scavi per rete acque bianche, illuminazione pubblica e cassonetto percorsi pedonali	20
5	Posa e rinterro di tubazioni, pozzetti e plinti ill. pubblica	14
6	Posa di cordonate e cassonetto percorsi pedonali	18
7	Formazioni rilevato	7
8	Posa pavimentazione in terra stabilizzata	14
9	Messa a dimora di alberi e arbusti	28
10	Lavori di completamento: recinzione, installazione armature urbane a LED e telecamera videosorveglianza, inerbimento	5
11	Opere di completamento area prospiciente il cimitero: fresatura strada esistente e scavo cassonetto stradale	2
12	Opere di completamento area prospiciente il cimitero: posa di cordonate e getto pavimentazione in cls	4
13	Opere di compl.to area prospiciente il cimitero: posa di cordonate, cassonetto percorsi pedonali e pav.terra stabilizzata	12
14	Opere di completamento area prospiciente il cimitero: Formazione di rilevati e messa a dimora alberi e arbusti	4
15	Sgombero cantiere	2

FINE LAVORI 110 GG

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

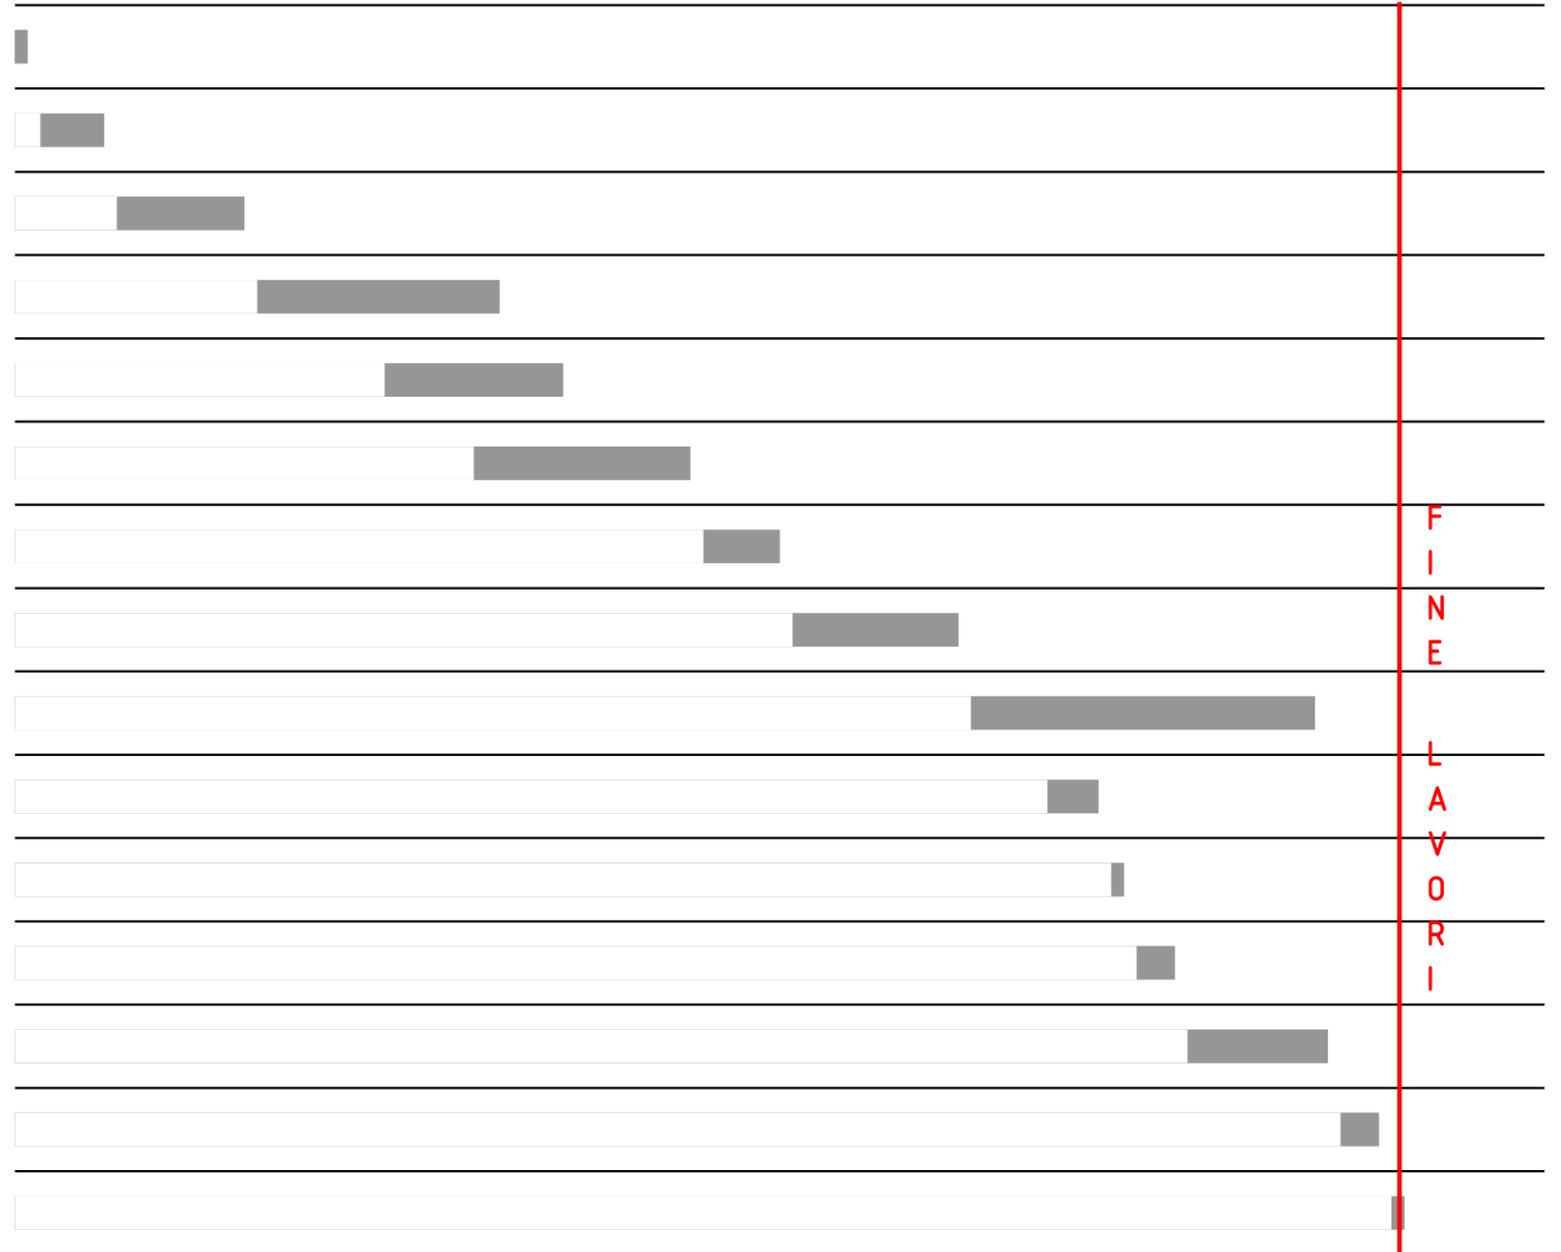

FINE LAVORI
